

ボーリング柱状図

調査名 **波崎レクセンターハウス新築工場地質調査委託**


ボーリングNO.									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNO.

ボーリング名	081200592003		調査位置			北緯	35° 49' 18.1000"	
発注機関	営繕課		調査期間	2005-11 ~ 2005-11		東経	140° 46' 13.7000"	
調査業者名	東洋地質株式会社		主任技師			現場代理人	コアア 錐定者	
ボーリング責任者			試錐機			ハンマー落下用具	全自動型	
孔口標高	3.64 m	角度		地盤勾配		使用機種	エンジン	
総掘進長	10.45 m					ポンプ		

標尺 (m)	層高 (m)	厚度 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m)	標準貫入試験				原位置試験 試験名および結果	試料採取 深度 (m)	採取方法	室内試験	掘進月日
												10cmごとの打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)							
	3.24	0.40	0.40		埋土 (FI) 細砂 (FS)	褐灰					0.60									
-1					暗褐						1.15	10	30							
-2					暗褐						2.15	20	30							
-3					暗褐						3.15	27	30							
-4	0.36	3.60	4.00		細砂 (FS)						4.15	33	30							
-5					暗褐						5.15	36	30							
-6					暗褐						6.15	35	30							
-7					暗灰						7.15	36	30							
-8	4.36	4.00	8.00		細砂 (FS)						8.15	40	30							
-9					暗灰						9.15	43	30							
-10	6.81	2.45	10.45								10.15	45	30							
											10.45									

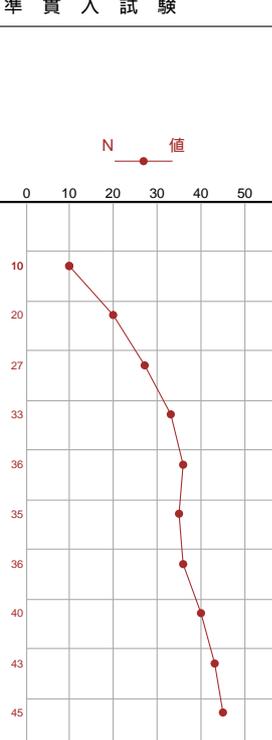



若松運動場

若松運動場

約2.5km

波崎レクセンター

矢田部

須田小

西須田

須田浜

須田

東須田
